

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DE INICIO	7	12	2016
	DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN	6	12	2017
	DÍA	MESES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

16	1	2017
DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Q1470.2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73	27,008,803.73	0%	7,025,921.81	610	639	1%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEs-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTR. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA NO. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
TOTAL		13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73							

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOE) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: M.C. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: isai_g@rincon.tecnm.mx
 TEL 10 DIGITOS: 476 7447100

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DRA. MIRIAM RIVERA SÁNCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DIRECCIÓN GENERAL

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO: 21 / 9 / 2016

DOMICILIO COMPLETO: Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas, Purísima del Rincón, Gto. C.P. 38413

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 / 5 / 2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2015	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49	20%	4,123,176.87	610	639	30%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEs-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOTA: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OBRA Y ESTIMACIÓN 1 A LA 5.
TOTAL		4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA

CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN


CORREO ELECTRONICO: isai.gonzalez@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS: 476 7447100

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DRA. MIRNATIRERÍ SÁNCHEZ GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

DIRECCIÓN GENERAL

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)

PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

21	9	2016
DÍA	MES	AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	5	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA

16	01	2017
DÍA	MES	AÑO


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXOE 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 2

FOTOS DE ANTES:

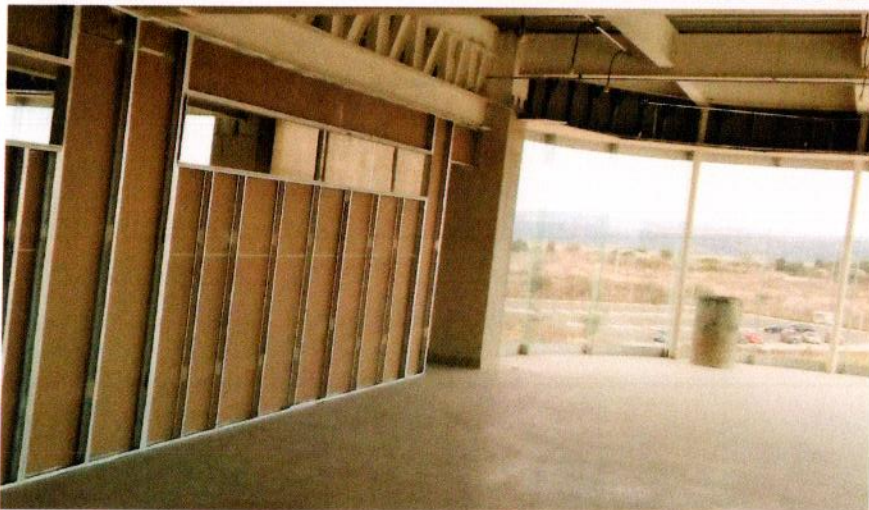

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	FECHA DE INICIO	<table border="1"><tr><td>21</td><td>9</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	21	9	2016	DÍA	MES	AÑO			COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA						
21	9	2016																
DÍA	MES	AÑO																
DOMICILIO COMPLETO	Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	<table border="1"><tr><td>18</td><td>5</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	18	5	2017	DÍA	MES	AÑO	FECHA	<table border="1"><tr><td>16</td><td>01</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	16	01	2017	DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
18	5	2017																
DÍA	MES	AÑO																
16	01	2017																
DÍA	MES	AÑO																

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXOE 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN. HOJA 2 DE 2

FOTOS DE AHORA:



Guanajuato, Gto., 10 de febrero de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE#2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chávez, Jefe de Planeación, Programación y Evaluación, le comento el avance físico y financiero de las obras:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, adjudicada al Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156 (6220)	\$5,850,033.70	\$4,532,042.23	56.00%	68%	Última estimación tramitada No. 30
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$0.00			
Totales		\$6,666,666.64	\$4,532,042.23			

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.4156 (6220)	\$4,009,266.74	\$1,775,318.99	48.00%	44.00%	Última estimación tramitada No. 05

Construcción de un nuevo edificio denominado “Unidad Académica Vertical” en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velázquez Díaz

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.4156 (6220)	\$13,489,906.03	\$3,498,465.07	1.80%	0.26%	Anticipo tramitado
INT PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832276.4156 (6220)	\$28,991.67	\$28,991.67			
Totales		\$13,518,897.70	\$3,527,456.74			

Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411, adjudicada al Contratista: GYP Construcciones, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCO	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156(6220)	\$1,876,539.24	\$446,411.77	0.0 %	0.0 %	Anticipo tramitado

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2014 y PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCOMGVL/rmcg
