

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

| | | |
|---|-------------|---------------------------------------|
| DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO | 2016 | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO |
| CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO | | FECHA DEL REPORTE |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | FECHA DE INICIO | 31 12 2016 DÍA MES AÑO | FECHA DEL REPORTE | 16 1 2017 DÍA MES AÑO |
| DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413 | FECHA DE TERMINACIÓN | 29 5 2017 DÍA MES AÑO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA | |

| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | RECURSO ASIGNADO | | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO | | MATRÍCULA (2013-2014) | MATRÍCULA (2014-2015) | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|----------------|---|------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | | % | \$ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PROEXO 2014 | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN. | 6,666,666.66 | 6,999,666.66 | 13,666,333.32 | 13,666,333.32 | 68% | 9,064,084.43 | 610 | 639 | 56.00% | CONVENIO DE COLABORACIÓN CONV/SOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OBITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProEXOES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO EL 24/07/2015 Y TÉRMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACIÓN GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-146 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, ESTIPULANDO FECHAS DE INICIO 31/12/2016 Y TÉRMINO 29/05/2017. |
| | | | | | | | | | | | |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2014".

| | |
|---|---|
| RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : MC. ISAI GONZALEZ GAONA CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CORREO ELECTRONICO: isai.g@rincón.tecnm.mx TEL 10 DIGITOS : 476 7447100 | DIRECTOR DEL INSTITUTO DRA. MÓNICA RIVERA SÁNCHEZ GÓMEZ NOMBRE Y FIRMA |
|---|---|



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFÍCO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) | PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) | AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) |
| PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) | PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) | OTROS (ESPECIFICAR) |

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

| | | |
|-----|-----|------|
| 31 | 12 | 2016 |
| DÍA | MES | AÑO |

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

| | | |
|-----|-----|------|
| 29 | 5 | 2017 |
| DÍA | MES | AÑO |

FECHA

| | | |
|-----|-----|------|
| 19 | 01 | 2017 |
| DÍA | MES | AÑO |



COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXO 2014. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 2

FOTOS DE ANTES:

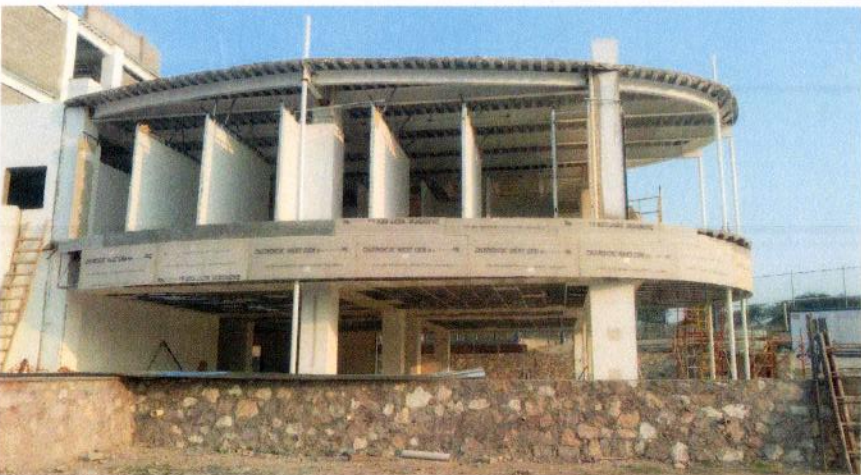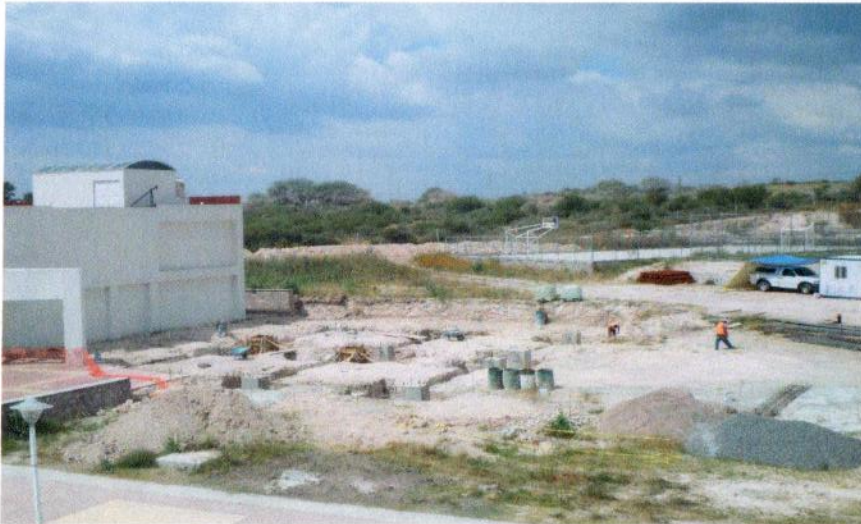

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA
DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

| | | |
|-----|-----|------|
| 31 | 12 | 2016 |
| DÍA | MES | AÑO |

**DOMICILIO
COMPLETO** Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

**FECHA DE
TERMINACIÓN DE
CONTRATO**

| | | |
|-----|-----|------|
| 29 | 5 | 2017 |
| DÍA | MES | AÑO |

FECHA

| | | |
|-----|-----|------|
| 19 | 01 | 2017 |
| DÍA | MES | AÑO |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROEXO 2014. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 2 DE 2

FOTOS DE AHORA:



Guanajuato, Gto., 10 de febrero de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE#2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chávez, Jefe de Planeación, Programación y Evaluación, le comento el avance físico y financiero de las obras:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, adjudicada al Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.

| Fuente de Financiamiento | Clave Presupuestal | Contratado | Ejercido | Avance Físico Real | Avance Financiero Real | Observaciones |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| 514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON | 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156 (6220) | \$5,850,033.70 | \$4,532,042.23 | 56.00% | 68% | Última estimación tramitada No. 30 |
| 514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo) | | \$816,632.94 | \$0.00 | | | |
| Totales | | \$6,666,666.64 | \$4,532,042.23 | | | |

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

| Fuente de Financiamiento | Clave Presupuestal | Contratado | Ejercido | Avance Físico Real | Avance Financiero Real | Observaciones |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 | 30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.4156 (6220) | \$4,009,266.74 | \$1,775,318.99 | 48.00% | 44.00% | Última estimación tramitada No. 05 |

Construcción de un nuevo edificio denominado “Unidad Académica Vertical” en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velázquez Díaz

| Fuente de Financiamiento | Clave Presupuestal | Contratado | Ejercido | Avance Físico Real | Avance Financiero Real | Observaciones |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 | 30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832176.4156 (6220) | \$13,489,906.03 | \$3,498,465.07 | 1.80% | 0.26% | Anticipo tramitado |
| INT PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 | 30.A16.3058.Q1470.02.05.03.515832276.4156 (6220) | \$28,991.67 | \$28,991.67 | | | |
| Totales | | \$13,518,897.70 | \$3,527,456.74 | | | |

Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411, adjudicada al Contratista: GYP Construcciones, S.A. de C.V.

| Fuente de Financiamiento | Clave Presupuestal | Contratado | Ejercido | Avance Físico Real | Avance Financiero Real | Observaciones |
|--|--|----------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCO | 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156(6220) | \$1,876,539.24 | \$446,411.77 | 0.0 % | 0.0 % | Anticipo tramitado |

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2014 y PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCOMGVL/rmcg
