

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DE INICIO 7 9 2015
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN 2 7 2016
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

4 7 2016
 DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Q1470.2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	7,000,000.00	13,666,666.66	11,700,067.41	61.30%	4,087,041.66	610	639	81.50%	CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProExOEEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR).

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: isgonzalez@tespurisima.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DRALMIRNA TREM SANCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA
DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

7	9	2015
DÍA	MES	AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE
TERMINACIÓN DE
CONTRATO

2	7	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA


4	7	2016
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Q1470.2014. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 1

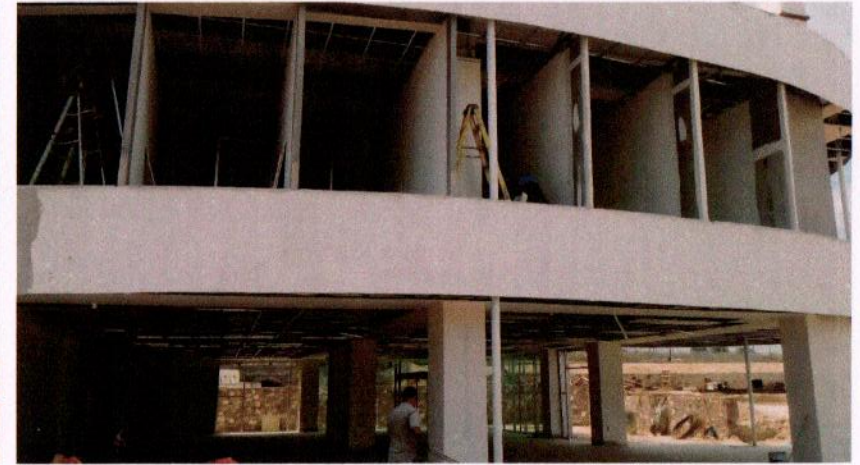



Secretaría
de Obra Pública

"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/1047/16

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2016

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE#2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chávez, Jefe de Planeación, Programación y Evaluación, le comento el avance físico y financiero de la obra:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, adjudicada al Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.


Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Asignado	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156 (6220)	\$5,850,033.70	\$5,850,033.70	\$4,087,041.66	81.50%	61.30%
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$816,632.94	\$0.00		
Totales		\$6,666,666.64	\$6,666,666.64	\$4,087,041.66		

Lo anterior con la finalidad de remitirlo al Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXO/2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


C.P. WILFRIDO CORTEZ OLMEDO

WCO/MCVL/rmcg

Secretaría de Obra Pública

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00

guanajuato.gob.mx
